

**GMINA JABŁONNA**


# **ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH**

**Informacja Wójta Gminy Jabłonna w zakresie realizacji projektu dotyczącego budowy ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-jezdnych w Gminie Jabłonna w ramach projektu partnerskiego pn.: "Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew**

Jabłonna, 16 maja 2018 r.



Ten dokument sfinansowano w ramach  
Zintegrowanych Inicjatyw Regionalnych Metropolii Warszawskiej




GMINA JABŁONNA

# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

## Partner Projektu - Gmina Jabłonna


- z chwilą przystępowania do projektu partnerskiego brak jakiejkolwiek dokumentacji projektowej związanej z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy;
- termin złożenia wspólnego wniosku aplikacyjnego upływał 29 lipca 2016 roku;
- w II i III kw. 2016 roku zlecono i przygotowano: koncepcję przebiegu tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna, Program Funkcjonalno- Użytkowy, Studium Wykonalności (wyboru Wykonawcy dokonał Lider – Miasto Legionowo zgodnie z ustawą Pzp).






GMINA JABŁONNA

# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

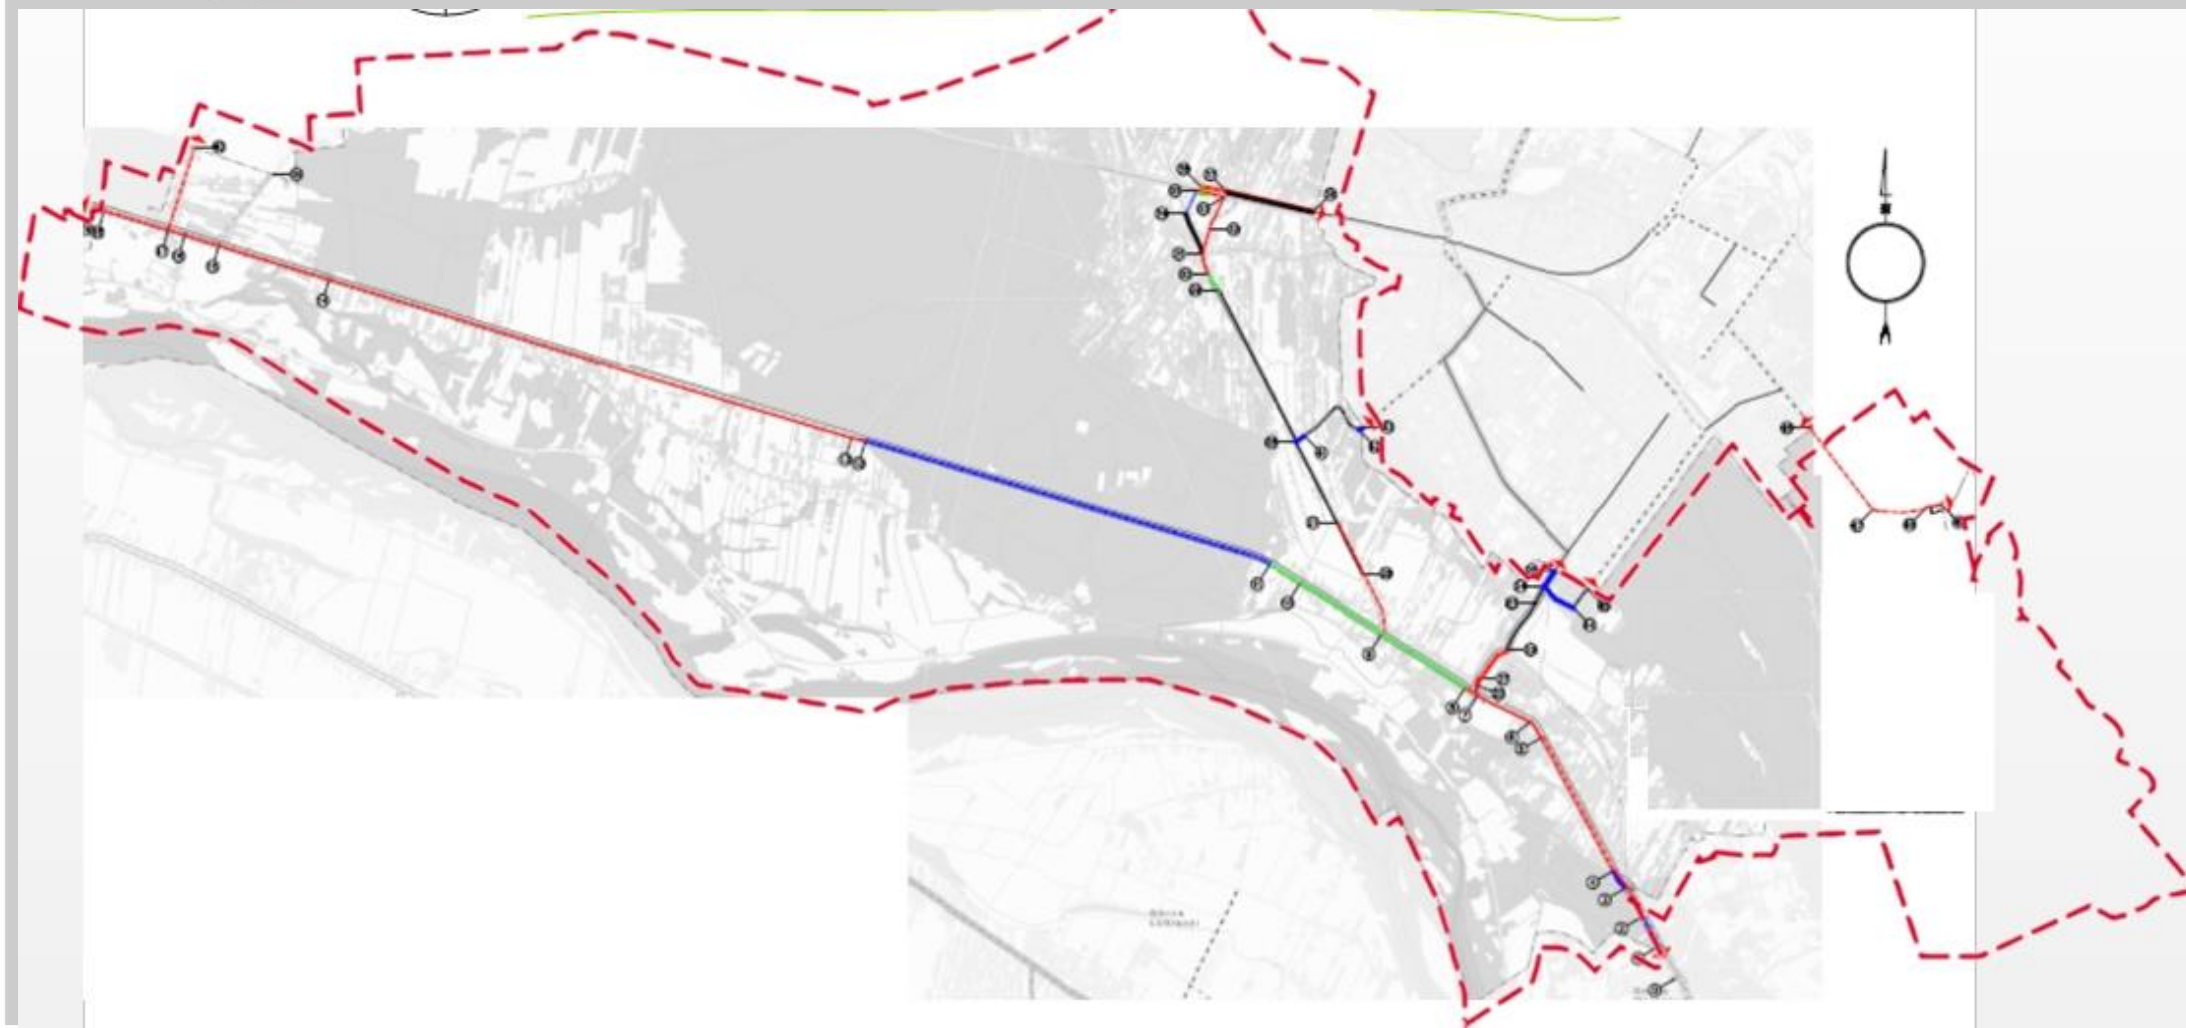

Nowe rozwiązania realizujemy w ramach  
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych metropolii warszawskiej



GMINA JABŁONNA

## ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

### Gmina Jabłonna - Partner nr 3 Projektu.

W dniu 6 grudnia 2016 roku MJWPU opublikowała listę projektów wybranych do dofinansowania.

Projekt Partnerski znalazł się na I miejscu tejże listy.

Wartość projektu przypadająca na Partnera- 5 204 380,77 zł

Poziom dofinansowania- 80 %


Kwota dofinansowania z EFRR- 4 163 504,62 zł

Środki własne Gminy Jabłonna- 1 040 876,15 zł

Z uwagi na brak projektów wykonawczych podjęto decyzję o realizacji projektu w formule zaprojektuj-wybuduj.








GMINA JABŁONNA

# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

**Dzięki realizacji projektu miało powstać:**

- 3 065 metrów ścieżek rowerowych (SR) oraz wydzielonych ścieżek rowerowych (WSR);
- 2 440 metrów pasów ruchu przeznaczonych wyłącznie dla rowerów w jezdni;
- 10 204 metry ciągów pieszo-rowerowy (CPR);
- 570 metrów chodników.






GMINA JABŁONNA

# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

## Działania towarzyszące:

- budowa oświetlenia w technologii led;
- budowa 3 przejazdów dla rowerzystów;
- przebudowa linii telekomunikacyjnych;
- przebudowa linii elektroenergetycznych;
- budowa odwodnienia w wyznaczonych przebiegach ścieżek;
- budowa parkingów dla rowerów;
- przebudowa przejścia podziemnego PKP;
- wykupy gruntów.






GMINA JABŁONNA

# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

## Kamienie milowe projektu:

- zakładany początkowo termin realizacji projektu: 1 stycznia 2016 – 31 maja 2018;
- zmiana formuły realizacji projektu i ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej: 7 kwietnia 2017 r.;
- opublikowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia: 26 maja 2017 r.;
- pierwsze sygnały o niedoszacowaniu projektu oraz konieczności przyjęcia innych rozwiązań niż te opisane w koncepcji: czerwiec – lipiec 2017 r.;
- decyzja (w porozumieniu z Liderem) o zmniejszeniu zakresu rzeczowego projektu i ubieganiu się o dofinansowanie na wyłączony zakres robót: sierpień 2017 r.;
- złożenie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie II etapu:  
31 sierpnia 2017 r.





GMINA JABŁONNA


## ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

**Dzięki realizacji I etapu projektu (realizowanego w formule partnerskiej) powstanie:**

- 8 459 metrów ścieżek rowerowych (SR) oraz wydzielonych ścieżek rowerowych (WSR);
- 3 410 metrów pasów ruchu przeznaczonych wyłącznie dla rowerów w jezdni;
- 1 265 metry ciągów pieszo-rowerowy (CPR);
- 3 200 metrów chodników.








GMINA JABŁONNA

## ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

### Stan obecny:

- ogłoszono zamówienie dotyczące wyboru wykonawcy zadania- 22 lutego 2018 r.;
- postępowanie unieważniono 4 kwietnia 2018 r.;
- kolejne postępowanie ogłoszono 16 kwietnia 2018 r.;
- termin rzeczowej realizacji zadania: do 26 października 2018 r.;
- termin składania ofert: 16 maja 2018 roku godzina 11:00;
- łącznie wpłynęły 4 oferty.





# Gmina Jabłonna

Urząd Gminy Jabłonna  
ul. Modlińska 152  
05-110 Jabłonna  
tel.: 22 76 77 300  
fax: 22 77 43 834  
e-mail: [urzad@jablonna.pl](mailto:urzad@jablonna.pl)

Jabłonna, dnia 16.05.2018 r.

## ZP.271.1.10.2018

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Łomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew”

### INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia 16.05.2018 r.

Zamawiający, Gmina Jabłonna, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przekazuje poniżej następujące informacje:

1) **Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:**

Część nr 1: 2 391 357,64 zł brutto

Część nr 2: 1 013 386,34 zł brutto

Część nr 3: 289 408,31 zł brutto

Część nr 4: 805 847,71 zł brutto

2) **Zestawienie ofert:**

1. **Królik Włodzimierz KROL Zakład Robót Drogowych i Inżynieryjno- Instalacyjnych, ul. Łukasiewicza 9G, 05-200 Wołomin**

### CZEŚĆ 1

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi związana z budową ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej ulicy Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 4+263,28 do km 11+322,44
Cena za wykonanie zamówienia	<b>Cena brutto: 5 725 562,12 zł</b>



Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE <i>(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ)</i>	<b>60 miesięcy</b>

## CZEŚĆ 2

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 632 polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodnika dla pieszych oraz zjazdów na km od 57+991 do 59+415 na działce nr ewid. 40 obręb nr 7 - Józefów II, Gmina Jabłonna
Cena za wykonanie zamówienia	<b>Cena brutto: 1 990 068,97 zł</b>
Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE <i>(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ)</i>	<b>60 miesięcy</b>

## CZEŚĆ 4

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi związana z budową ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 0+000,00 do km 2+042,80
Cena za wykonanie zamówienia	<b>Cena brutto: 2 426 558,27 zł</b>
Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE <i>(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ)</i>	<b>60 miesięcy</b>

### 2. Ok-bud Piotr Morawski, ul. Warszawska 103, 05-190 Nasielsk

## CZEŚĆ 2

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 632 polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodnika dla pieszych oraz zjazdów na km od 57+991 do 59+415 na działce nr ewid. 40 obręb nr 7 - Józefów II, Gmina Jabłonna
Cena za wykonanie zamówienia	<b>Cena brutto: 1 990 000,00 zł</b>
Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI	



NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE <i>(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ)</i>	<b>84 miesiące</b>
--	--------------------

#### **CZEŚĆ 4**

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi związana z budową ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 0+000,00 do km 2+042,80
Cena za wykonanie zamówienia	<b>Cena brutto: 2 150 000,00 zł</b>
Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE <i>(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ)</i>	<b>84 miesiące</b>

### **3. Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa**

#### **CZEŚĆ 1**

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi związana z budową ścieżek rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej ulicy Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 4+263,28 do km 11+322,44
Cena za wykonanie zamówienia	<b>Cena brutto: 6 760 467,08 zł</b>
Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE <i>(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ)</i>	<b>84 miesiące</b>

#### **CZEŚĆ 4**

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi związana z budową ścieżek rowerowych wzdłuż ulicy Modlińskiej w Gminie Jabłonna od km 0+000,00 do km 2+042,80
Cena za wykonanie zamówienia	<b>Cena brutto: 2 820 755,43 zł</b>
Proponowany OKRES GWARANCJI I RĘKOJMI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE <i>(pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ)</i>	<b>84 miesiące</b>



**4. ROBOTY ZIEMNE – BUDOWLANE Janusz Mróz, ul. Sobieskiego 41 lok. 30, 05-120 Legionowo**

**CZĘŚĆ 2**

Przedmiot zamówienia	Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 632 polegająca na budowie ścieżki rowerowej, chodnika dla pieszych oraz zjazdów na km od 57+991 do 59+415 na działce nr ewid. 40 obręb nr 7 - Józefów II, Gmina Jabłonna
Cena za wykonanie zamówienia	<b>Cena brutto: 2 150 000,00 zł</b>
Proponowany OKRES GWARANCJI I REKOJMI NA WYKONANE ROBOTY BUDOWLANE (pozacenowe kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, które podlega punktacji zgodnie z pkt. 13.1 SIWZ)	<b>84 miesiące</b>

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – **wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.**

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, **składane są w oryginale.**

Wójt Gminy Jabłonna  
Jarosław Chodorski

ZP.271.1.10.2018

.....  
*oznaczenie Wykonawcy  
(np. pieczęć)*

## WZÓR

### Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

**dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Jabłonna w ramach projektu: „Poprawa warunków do rozwoju przyjaznych środowisku form transportu poprzez utworzenie systemu dróg rowerowych na terenie gmin: Czosnów, Jabłonna, Legionowo, Lomianki, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Radzymin i Wieliszew””**


NAZWA (FIRMA) ALBO IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY : .....

SIEDZIBA ALBO MIEJSCE ZAMIESZKANIA WYKONAWCY: .....

Oświadczamy, że nie należymy / należymy\* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

\* *niepotrzebne skreślić*

.....  
podpis upoważnionej osoby



GMINA JABŁONNA


# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

## Co dalej?:

I etap:

- wniosek o zwiększenie środków własnych na realizację zadania;
- możliwość wydłużenia terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2019 roku (tak jak robią to inne gminy realizujące projekt budowy ścieżek rowerowych np. Brwinów oraz Sulejówek).





GMINA JABŁONNA

# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH




## ETAP I



Współpraca z Urzędem Miejskim w Jabłonce  
Zadanie: Projektowanie i budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu "Bezpieczny i wygodny transport rowerowy"






GMINA JABŁONNA

# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

## II etap:

- na opublikowanej 9 marca 2018 roku liście rankingowej, Gmina Jabłonna znalazła się na III miejscu. Oczekujemy na decyzję związaną z przesunięciem środków finansowych z innych działań;
- zgodnie z regulaminem konkursu II etap będzie realizowany do 30 czerwca 2020 roku.





GMINA JABŁONNA

# ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH


Zakres rzeczowy **I i II etapu** odpowiada zakresowi jaki został przypisany Gminie Jabłonna w tzw. Master Planie Rowerowym przygotowanym przez M.st. Warszawa w ramach ZIT WOF.



Gmina Jabłonna



Tworzenie warunków w ramach  
Zintegrowanej Strategii Regionalnych Metropolii Warszawskiej



GMINA JABŁONNA

## ROZBUDOWA SIECI ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

### **Aktualna korespondencja:**

Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020 na posiedzeniu 10 maja 2018 r. przyjął zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020, w tym proponowane przesunięcie środków z Poddziałania 3.1.1 i 3.2.1 do Poddziałania 4.3.2 w łącznej kwocie 17 026 761 EUR. Aby przyjęte zmiany zaczęły obowiązywać niezbędna jest jeszcze ich formalna akceptacja przez Komisję Europejską (KE). Zatwierdzenie zmian przez KE pozwoli na podjęcie kroków formalnych (uchwała ZWM) w celu dofinansowania projektów będących na liście rezerwowej dla konkursu RPMA.04.03.02–IP.01-14-053/17 – ścieżki rowerowe. O dalszych działaniach odnośnie do projektów z listy rezerwowej konkursu RPMA.04.03.02–IP.01-14-053/17 zostaną Państwo poinformowani.

